


# Baustellenticker

## Projekt Radwegsanierung K 22

Lage Tönisvorst (Biwak und Reckenhöfe)

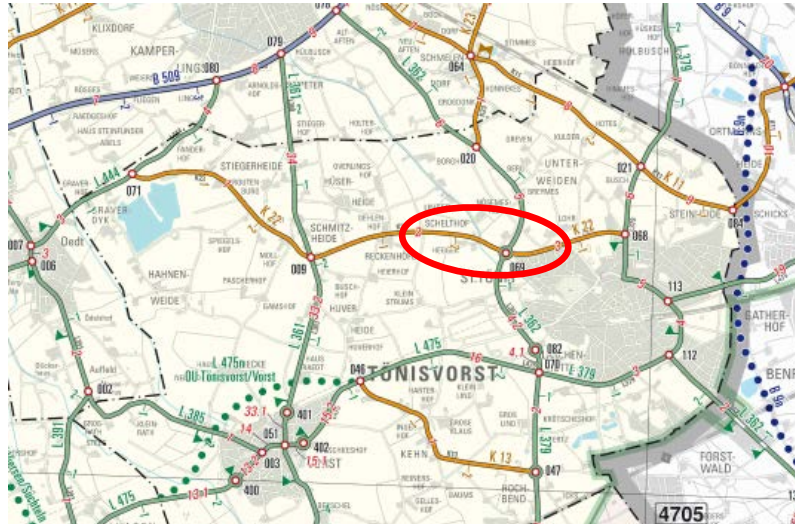

Projektleiter: Joachim Albers, 02162/39-1236  
[Joachim.albers@kreis-viersen.de](mailto:Joachim.albers@kreis-viersen.de)

Ausführende Firma: Fa. Willy Dohmen GmbH  
Hasenbuschstraße 46  
52531 Übach-Palenberg  
Telefon: 02451-98500  
Bauleiter: Herr Nießen

Baubeginn: 22.11.2023  
Fertigstellung: Frühjahr 2024

Aktuelles: Voraussichtlich am Mittwoch, den 22.11.2023 beginnen die Bauarbeiten am Radweg an der K 22 in Tönisvorst.

Die Maßnahme umfasst Radwegbauarbeiten seitens des Kreises Viersen auf einer Gesamtlänge von rund 1.900 m zwischen Hüserheide und Unterschelthof (Reckenhöfe) sowie Schelthofer Straße bis Gelderner Straße (Biwak).

Bei dem hier zu erneuernden Bereich handelt es sich um 3 Bauabschnitte. Begonnen wird im Bauabschnitt 1. Die Arbeiten in den Bauabschnitten 2 und 3 erfolgen erst zu Beginn des neuen Jahres.

Der Bauabschnitt 1 verläuft mit einer Länge von etwa 1.350 m von der Hüserheide/Huverheide bis Unterschelthof/Fliethbach (BA 1.1) bzw. von Unterschelthof/Fliethbach ca. 150 m in Richtung Kreisverkehr nach Osten (BA 1.2).

Die Arbeiten erfolgen hier unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn mit Einsatz einer Lichtsignalanlage als Wanderbaustelle in Längen von max. 300 m.

Die Umleitung des Radfahrer- und Fußgängerverkehrs erfolgt ab Reckenhöfe über Hüserheide nach Osten, über Unterschelthof nach Süden (BA 1.1) und von Unterschelthof nach Norden und Osten parallel zur L 362 zurück zum Kreisverkehr nach Süden (BA 1.2).

Der Bauabschnitt 2 verläuft mit einer Länge von etwa 420 m von der Tankstelle Markant bis Schelthofer Straße (BA 2.1) und von der Schelthofer Straße bis Am Dängelshof (BA 2.2).

Für den BA 2.1 wird eine Einbahnstraße vom Kreisel bis zur Schelthofer Straße (Richtung Osten frei) eingerichtet. Der Verkehr von Osten kommend wird über die Gelderner Straße/Westring/Vorster Straße/Düsseldorfer Straße (L362) umgeleitet.

Die Radfahrer-/Fußgängerumleitung im BA 2.1 verläuft ab dem Kreisel über die Düsseldorfer Straße nach Süden, ab Höhe Tack/Düsseldorfer Straße nach Osten und über die Schelthofer Straße zurück zur K 22

Im BA 2.2 wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Solange die Arbeiten im Bereich des Knotenpunktes Schelthofer Straße liegen, wird der Verkehr hier über eine 3-Phasen-Lichtsignalanlage geregelt. Ansonsten wird mit einer 2-Phasen-Lichtsignalanlage gearbeitet. Verlagern sich die Arbeiten in Richtung Einmündung Am Dängelshof, so wird diese voll gesperrt, die Umleitung erfolgt dann über die Gelderner Straße und Gerhart-Hauptmann-Straße.

Die Radfahrer-/Fußgängerumleitung verläuft im BA 2.2 über die Schelthofer Straße nach Süden, über die Heinrich-Böll-Straße nach Osten und Am Dängelshof zurück zur K 22

Der Bauabschnitt 3 liegt mit einer Länge von etwa 150 m zwischen Am Dängelshof und Gelderner Straße. Die Arbeiten erfolgen hier unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn mit Einsatz einer Lichtsignalanlage. Die Einmündung Gelderner Straße wird für die Arbeiten voll gesperrt, die Umleitung erfolgt dann über Am Dängelshof und Gerhart-Hauptmann-Straße.

Die Radfahrer-/Fußgängerumleitung verläuft im BA 3 über Am Dängelshof, Gerhart-Hauptmann-Straße, über Gelderner Straße und am Verbindungsweg rechts vom Tenniscenter zurück zur K 22.

Die Arbeiten der Gesamtbaumaßnahme werden in einer Bauzeit von rund 12 Wochen durchgeführt. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.
